Grenoble INP
OPERATION GEMME & CORIOLIS
Laboratoire LEGI
PLANNING DCE

N°	Lot	Nom	Durée	Début	Fin
1	-	OS préparation de chantier	0 j	Jeu 15/12	Jeu 15/12
2	4	Plan de retrait amiante : etablissement + instruction	30 jé	Lun 30/01	Mer 29/02
3	-	Préparation de chantier = 1 mois	20 j	Jeu 15/12	Mer 11/01
4	-	Délai chantier = 13 mois	288 j	Jeu 12/01	Lun 18/02
5	-	Réception	0 j	Lun 18/02	Lun 18/02
6	-	**ETUDES**	**110 j**	**Ven 06/01**	**Jeu 14/06**
7		**ETUDES TCE**	**15 j**	**Ven 27/01**	**Ven 17/02**
8		Remise des plans de réservations GEMME	0 j	Ven 27/01	Ven 27/01
9		Remise des plans de réservations CORIOLIS	0 j	Ven 17/02	Ven 17/02
10	4	**ETUDES GO**	**65 j**	**Ven 06/01**	**Ven 06/04**
11	-	**OPERATION GEMME**	**40 j**	**Ven 06/01**	**Ven 02/03**
12	BET	Descente de charges	0 j	Ven 06/01	Ven 06/01
13	BET	Remise plan des massifs	0 j	Ven 20/01	Ven 20/01
14	BET	Remise plan de longrines	0 j	Ven 27/01	Ven 27/01
15	BET	Remise plan de dallage porté	0 j	Ven 03/02	Ven 03/02
16	BET	Remise plan Elev Rdc / poutres	0 j	Ven 10/02	Ven 10/02
17	BET	Remise plan Dalle Hte Rdc	0 j	Ven 17/02	Ven 17/02
18	BET	Remise plan Elec R+1 / poutres	0 j	Ven 24/02	Ven 24/02
19	BET	Remise plan Dalle Hte R+1 terrasse	0 j	Ven 02/03	Ven 02/03
20	-	**OPERATION CORIOLIS**	**65 j**	**Ven 06/01**	**Ven 06/04**
21	BET	Descente de charges	0 j	Ven 06/01	Ven 06/01
22	BET	Remise plan des massifs	0 j	Ven 10/02	Ven 10/02
23	BET	Remise plan de longrines	0 j	Ven 24/02	Ven 24/02
24	BET	Remise plan de dallage porté	0 j	Ven 09/03	Ven 09/03
25	BET	Remise plan Elev Rdc / poutres	0 j	Ven 16/03	Ven 16/03
26	BET	Remise plan Dalle Hte Rdc	0 j	Ven 23/03	Ven 23/03
27	BET	Remise plan Elec R+1 / poutres	0 j	Ven 30/03	Ven 30/03
28	BET	Remise plan Dalle Hte R+1 terrasse	0 j	Ven 06/04	Ven 06/04
29	17	**ETUDES ASCENSEUR**	**40 j**	**Ven 13/04**	**Jeu 14/06**
30	MOE	Choix coloris cabine	0 j	Ven 13/04	Ven 13/04
31	17	Fabrication	40 j	Ven 13/04	Jeu 14/06
32	12	**ETUDES CHARPENTE METALLIQUES**	**55 j**	**Lun 06/02**	**Ven 20/04**
33		**G - H**	**40 j**	**Lun 06/02**	**Ven 30/03**
34		Plans atelier & chantier	15 j	Lun 06/02	Ven 24/02
35		Appro ; Fab ; Livraison	25 j	Lun 27/02	Ven 30/03
36		**CORIOLIS**	**55 j**	**Lun 06/02**	**Ven 20/04**
37		Plans atelier & chantier	20 j	Lun 06/02	Ven 02/03
38		Appro ; Fab ; Livraison	35 j	Lun 05/03	Ven 20/04
39	-	**TRAVAUX**	**299 j**	**Mer 09/11**	**Lun 18/02**
40	-	**Bâtiment Neuf GEMME**	**240 j**	**Mer 09/11**	**Mar 13/11**
41	1	Abattages des arbres	5 j	Mer 09/11	Mar 15/11
42	2	Terrassements	5 j	Lun 16/01	Ven 20/01
43	-	**Infastructure**	**25 j**	**Lun 06/02**	**Ven 09/03**
44	3	Pieux	5 j	Lun 06/02	Ven 10/02
45	4	Installation Grue	5 j	Lun 13/02	Ven 17/02
46	4	Recepage tête de pieux + Massifs + Longrines	15 j	Lun 20/02	Ven 09/03
47	-	**Superstructure**	**99 j**	**Lun 05/03**	**Mer 25/07**
48	4	Elévations Rdc	15 j	Lun 05/03	Ven 23/03
49	4	Dalle portée + Dallage Rdc	15 j	Lun 19/03	Ven 06/04
50	4	Plancher Ht Rdc	15 j	Lun 02/04	Ven 20/04
51	4	Elévations R+1	14 j	Lun 16/04	Ven 04/05
52	4	Plancher Ht R+1	18 j	Lun 07/05	Lun 04/06
53	4	Finitions GO	20 j	Mar 05/06	Lun 02/07
54	4	Cuvelage fosse ascenseur	2 j	Mar 24/07	Mer 25/07
55	-	**Enveloppe**	**68 j**	**Mar 19/06**	**Jeu 11/10**
56	5 - 16	Ossature + bardage bois	15 j	Mar 19/06	Lun 09/07
57	5 - 16	Isolation Ext. - Vétures	20 j	Mar 03/07	Lun 30/07
58	8	Murs rideaux	10 j	Mar 19/06	Lun 02/07
59	8	Menuiseries Ext. Alu	5 j	Mar 10/07	Lun 16/07
60	7	Menuiseries Ext. Bois	10 j	Mar 10/07	Lun 23/07
61	-	Hors d'air	0 j	Lun 23/07	Lun 23/07
62	7 - 8	Occultations (stores ext.)	10 j	Mar 24/07	Lun 27/08
63	6	Etanchéité	35 j	Mar 10/07	Lun 17/09
64	6	Protections gravillons	5 j	Ven 05/10	Jeu 11/10
65	-	Hors d'eau	0 j	Lun 23/07	Lun 23/07
66	-	**Aménagement Intérieur**	**172 j**	**Lun 20/02**	**Mar 13/11**
67	19-20	**Electricité**	**167 j**	**Lun 20/02**	**Mar 06/11**
68	20	Mise à la terre et incorporations	50 j	Lun 20/02	Ven 27/04
69	20	Chemin de câbles Niv 01	10 j	Mar 19/06	Lun 02/07
70	20	Câblages Niv 01	10 j	Mar 24/07	Lun 27/08
71	20	Chemin de câbles Niv 00	10 j	Mar 03/07	Lun 16/07
72	20	Câblages Niv 00	10 j	Mar 28/08	Lun 10/09
73	20	Pose et raccordement Armoire électrique	20 j	Mar 11/09	Lun 08/10
74	20	Appareillages	20 j	Mar 09/10	Mar 06/11

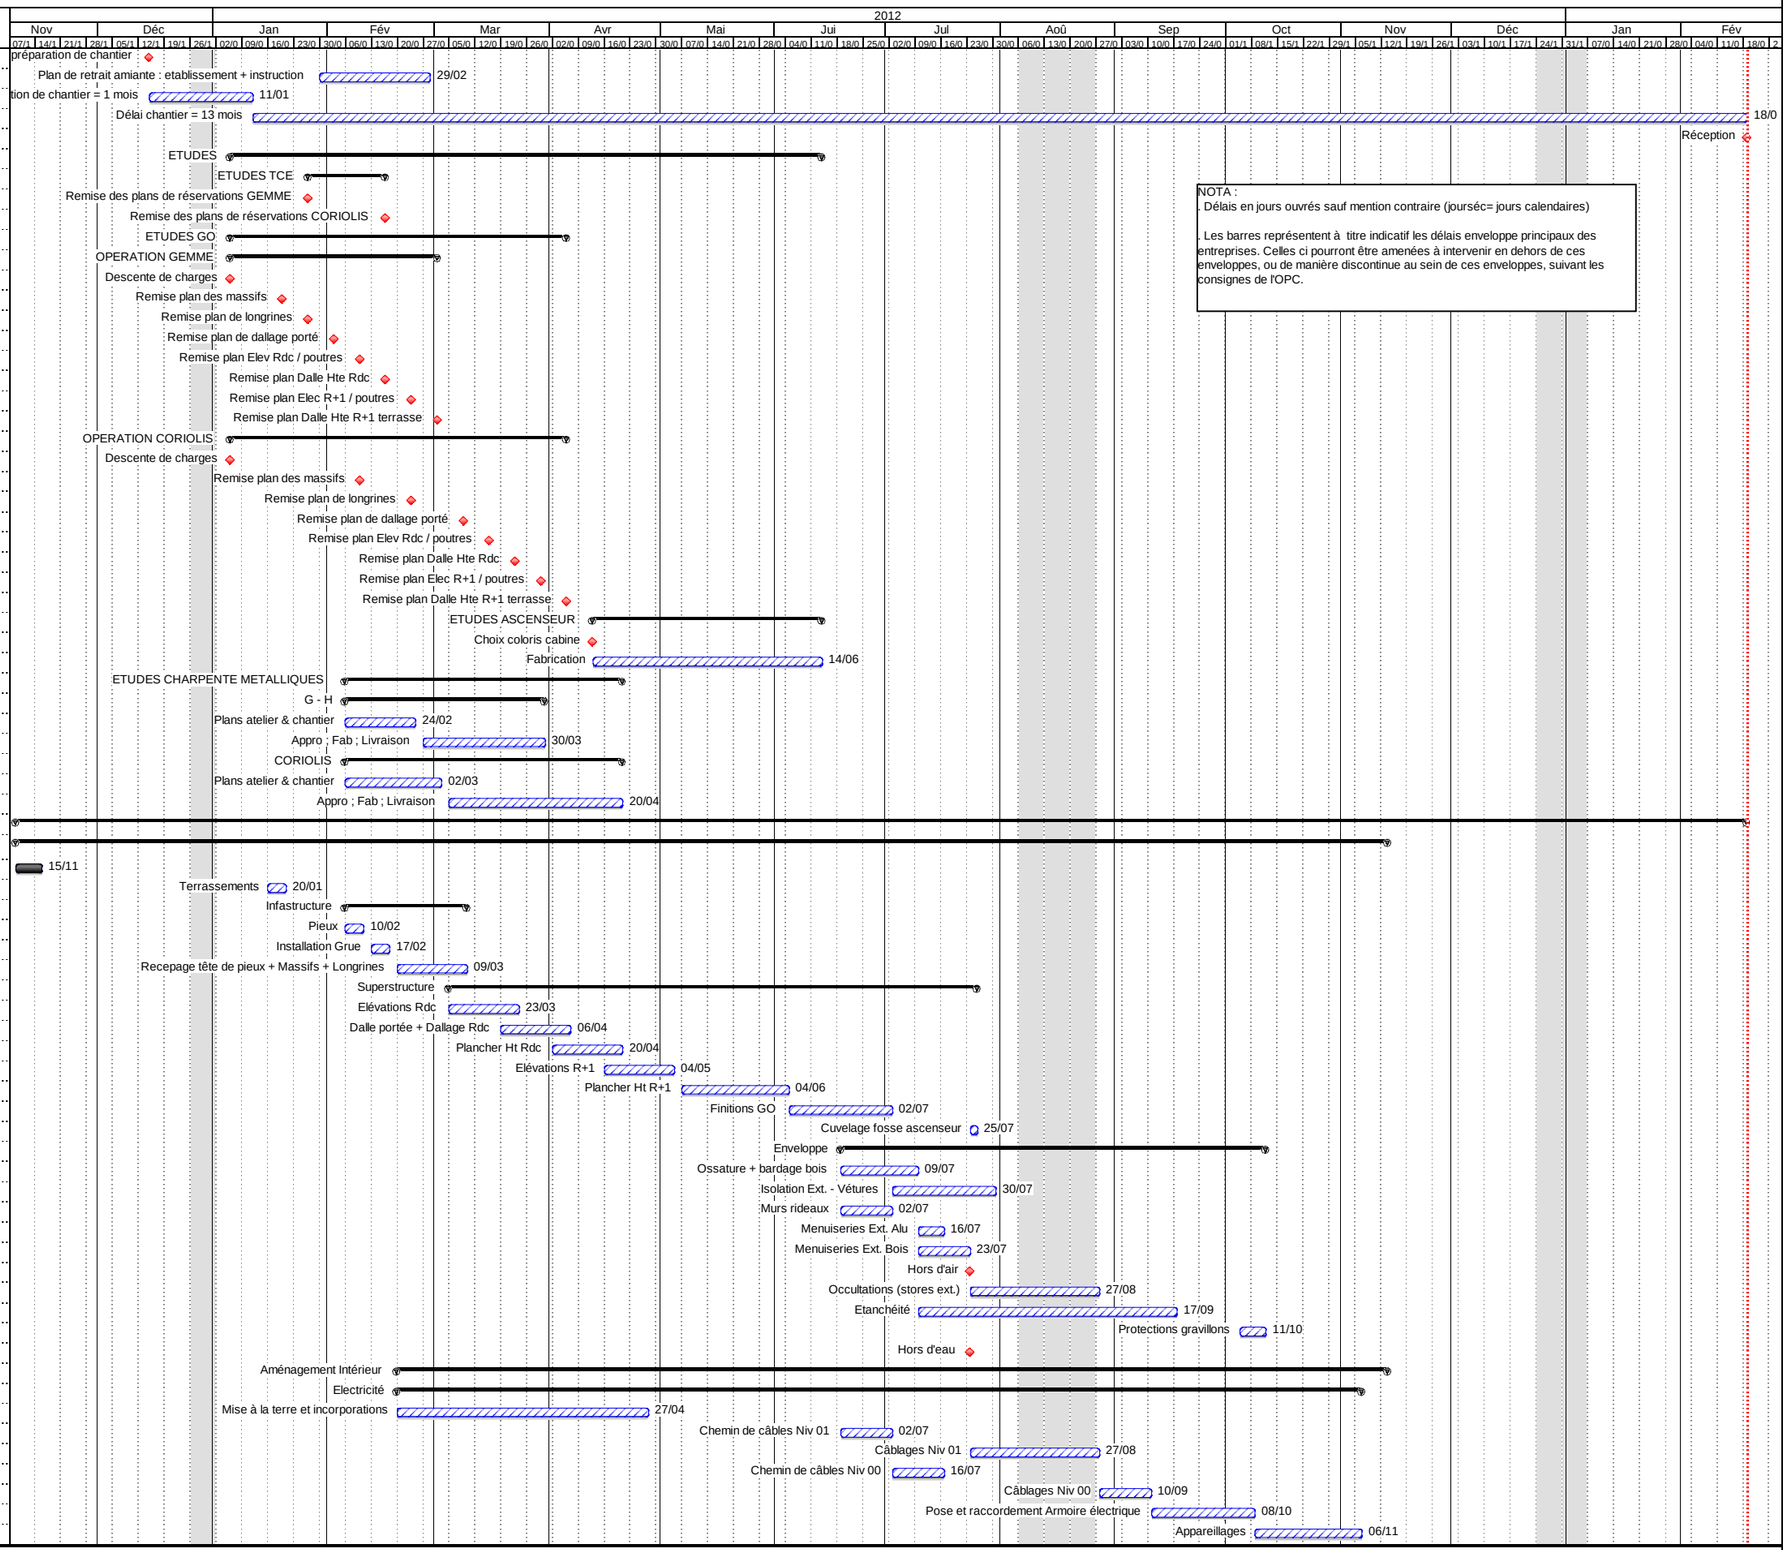

NOTA :
. Délais en jours ouvrés sauf mention contraire (joursé= jours calendaires)

. Les barres représentent à titre indicatif les délais enveloppe principaux des entreprises. Celles ci pourront être amenées à intervenir en dehors de ces enveloppes, ou de manière discontinue au sein de ces enveloppes, suivant les consignes de l'OPC.

Tâche — Récapitulative — Jalon — Marge totale — Marge libre

Grenoble INP
OPERATION GEMME & CORIOLIS
Laboratoire LEGI
PLANNING DCE

N°	Lot	Nom	Durée	Début	Fin
75	**19**	**CVC Plomb. Sanit. R+1**	**68 j**	**Mar 19/06**	**Jeu 11/10**
76	19	Tuyauteries chaud, froid et condensats K7	20 j	Mar 19/06	Lun 16/07
77	19	Calorifuge	10 j	Lun 30/07	Ven 31/08
78	19	Pose et raccordement 20 K7	10 j	Ven 21/09	Jeu 04/10
79	19	Raccordement électrique sur K7	3 j	Ven 05/10	Mar 09/10
80	19	Réseau aérauliques VMC sanitaires	3 j	Mar 19/06	Jeu 21/06
81	19	Réseaux aérauliques CTA	10 j	Mar 19/06	Lun 02/07
82	19	Calorifuge aéraulique	10 j	Lun 30/07	Ven 31/08
83	19	Alim EF/EC/Evac sanitaire	10 j	Mar 19/06	Lun 02/07
84	19	Appareillage sanitaires	3 j	Mar 09/10	Jeu 11/10
85	**19**	**CVC Plomb. Sanit. Rdc**	**134 j**	**Lun 09/04**	**Jeu 08/11**
86	19	Plancher chauffant	5 j	Lun 09/04	Ven 13/04
87	19	Tuyauteries chaud, froid et condensats K7	10 j	Mar 17/07	Lun 30/07
88	19	Calorifuge	5 j	Lun 03/09	Ven 07/09
89	19	Pose et raccordement 8 K7	5 j	Mar 02/10	Lun 08/10
90	19	Raccordement électrique sur K7	1 j	Mar 09/10	Mar 09/10
91	19	Réseau aérauliques VMC sanitaires	4 j	Ven 22/06	Mer 27/06
92	19	Réseaux aérauliques CTA	10 j	Mar 03/07	Lun 16/07
93	19	Calorifuge aéraulique	10 j	Lun 03/09	Ven 14/09
94	19	Alim EF/EC/Evac sanitaire	10 j	Mar 03/07	Lun 16/07
95	19	Appareillage sanitaires	2 j	Mer 07/11	Jeu 08/11
96	**19**	**CVC Plomb. Sanit. Toiture**	**45 j**	**Mar 04/09**	**Mar 06/11**
97	19	Pose CTA	2 j	Mar 04/09	Mer 05/09
98	19	Raccordement hydraulique CTA	2 j	Jeu 06/09	Ven 07/09
99	19	Réseaux aérauliques CTA	10 j	Mar 11/09	Lun 24/09
100	19	Calorifuge aéraulique	8 j	Mar 25/09	Jeu 04/10
101	19	Distribution électrique CTA	5 j	Mar 11/09	Lun 17/09
102	19	Pose aéroréfrigérant + raccordement hydrau	4 j	Mar 04/09	Ven 07/09
103	19	Distribution électrique Aéroréfrigérant	5 j	Lun 10/09	Ven 14/09
104	19-20	Appareillages Niv 01	15 j	Mar 18/09	Lun 08/10
105	19-20	Appareillages Niv 00	15 j	Mar 16/10	Mar 06/11
106	**9**	**Menuiseries Intérieures**	**65 j**	**Mar 24/07**	**Mar 13/11**
107	9	Huisseries Niv 01	0 j	Mar 24/07	Mar 24/07
108	9	Huisseries Niv 00	0 j	Mar 28/08	Mar 28/08
109	9	Menuiseries à peindre Niv 01	5 j	Mar 04/09	Lun 10/09
110	9	Menuiseries à peindre Niv 00	5 j	Mar 18/09	Lun 24/09
111	9	Placards Niv 01	5 j	Mar 16/10	Lun 22/10
112	9	Placards Niv 00	5 j	Mar 30/10	Mar 06/11
113	9	Meubles + mobiliers	5 j	Mar 30/10	Mar 06/11
114	9	Appareillages	10 j	Mar 30/10	Mar 13/11
115	**9**	**Salle de séminaire**	**45 j**	**Mar 04/09**	**Mar 06/11**
116	9	Gradins bois	15 j	Mar 04/09	Lun 24/09
117	9	Sièges	1 j	Mar 06/11	Mar 06/11
118	**10**	**Cloisons - Doublages - Faux-plafonds**	**60 j**	**Mar 24/07**	**Mar 06/11**
119	10	Cloisons Doublages Plafonds plâtre Niv 01	15 j	Mar 24/07	Lun 03/09
120	10	Cloisons Doublages Plafonds plâtre Niv 00	15 j	Mar 28/08	Lun 17/09
121	10	Ossatures Fx-plafonds Niv 01	5 j	Ven 14/09	Jeu 20/09
122	10	Ossatures Fx-plafonds Niv 00	5 j	Mar 25/09	Lun 01/10
123	10	Blanchissage	5 j	Mar 30/10	Mar 06/11
124	**14**	**Carrelage - Faïence**	**15 j**	**Mar 04/09**	**Lun 24/09**
125	14	Carrelage - Faïence Niv 01	5 j	Mar 04/09	Lun 10/09
126	14	Carrelage - Faïence Niv 00	5 j	Mar 18/09	Lun 24/09
127	**13**	**Sols collés PVC**	**25 j**	**Mar 25/09**	**Lun 29/10**
128	13	Sols collés PVC Niv 01	15 j	Mar 25/09	Lun 15/10
129	13	Sols collés PVC Niv 00	15 j	Mar 09/10	Lun 29/10
130	**15**	**Peintures Intérieures**	**40 j**	**Mar 11/09**	**Mar 06/11**
131	15	Peintures Intérieures Niv 01	20 j	Mar 11/09	Lun 08/10
132	15	Peintures Intérieures Niv 00	20 j	Mar 09/10	Mar 06/11
133	**17**	**Ascenseur**	**15 j**	**Jeu 26/07**	**Mer 05/09**
134	17	Guides / Partie mécanique / Portes	10 j	Jeu 26/07	Mer 29/08
135	17	Partie Electrique / Finitions	5 j	Jeu 30/08	Mer 05/09
136	**11**	**Métallerie - Serrurerie**	**54 j**	**Mar 05/06**	**Ven 07/09**
137	11	Equipements en toiture	5 j	Mar 05/06	Lun 11/06
138	11	Brise-soleil	3 j	Mar 12/06	Jeu 14/06
139	11	Blocs portes métalliques	1 j	Mar 19/06	Mar 19/06
140	11	Grille de ventilation	1 j	Lun 03/09	Lun 03/09
141	11	Escalier métallique	1 j	Mar 04/09	Mar 04/09
142	11	Gardes corps	2 j	Mer 05/09	Jeu 06/09
143	11	Mains courantes	1 j	Ven 07/09	Ven 07/09
144	**-**	**Aménagement Extérieur**	**114 j**	**Jeu 03/05**	**Lun 05/11**
145	2	VRD	20 j	Jeu 03/05	Lun 04/06
146	9	Terrasse bois	5 j	Lun 27/08	Ven 31/08
147	2	Espaces verts	15 j	Ven 12/10	Ven 02/11
148	11	Totem signalétique	1 j	Lun 05/11	Lun 05/11

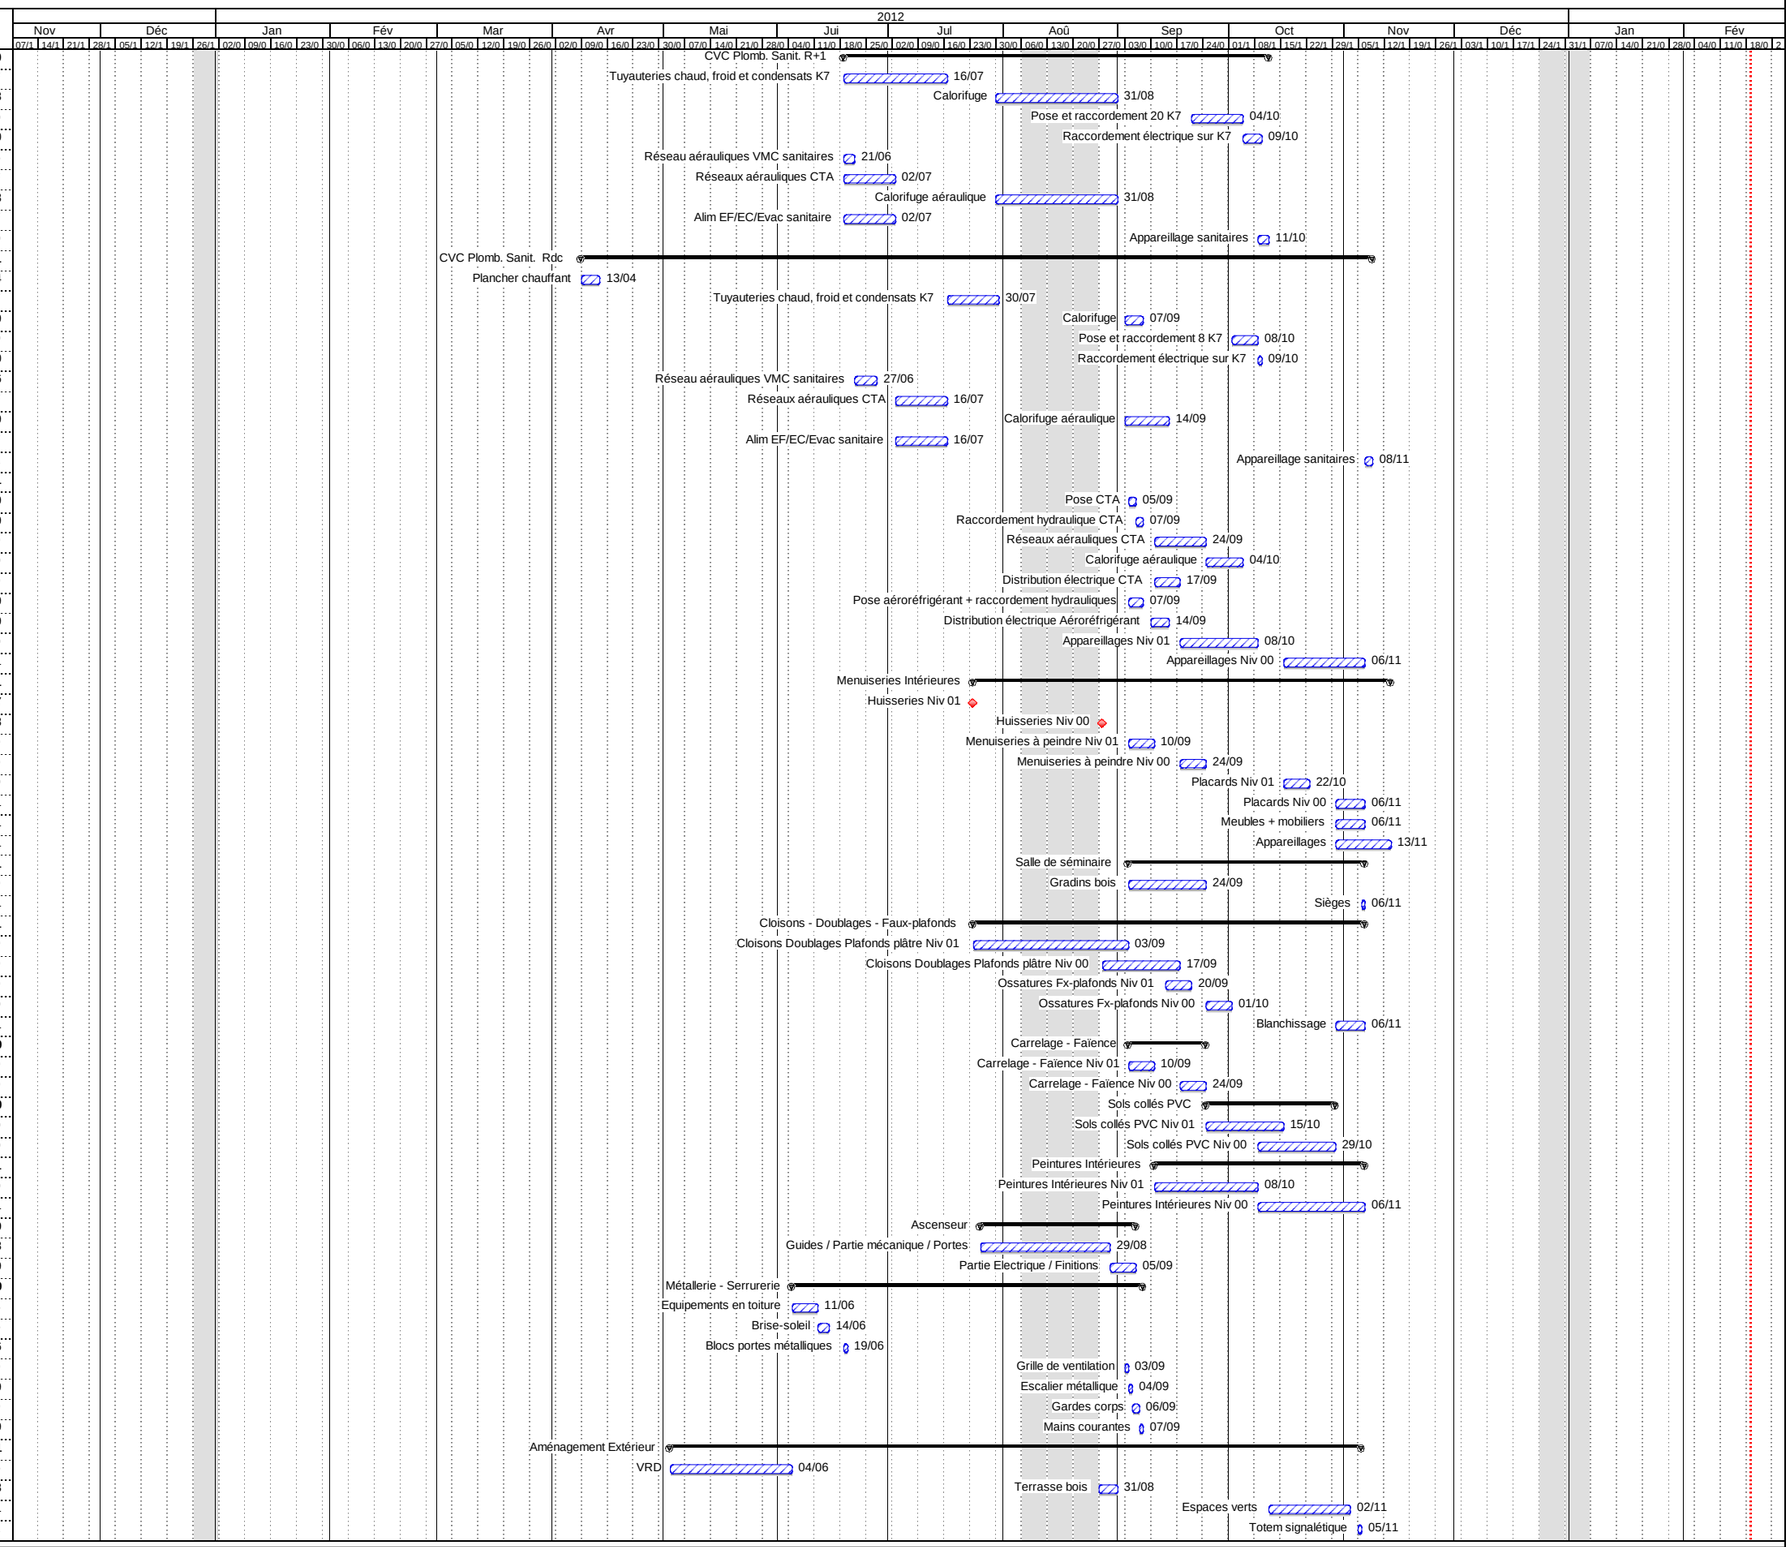

Tâche — Récapitulative — Jalon — Marge totale — Marge libre

Grenoble INP
OPERATION GEMME & CORIOLIS
Laboratoire LEGI
PLANNING DCE

N°	Lot	Nom	Durée	Début	Fin
149	-	**Bâtiment Existant G-H**	**103 j**	**Lun 05/03**	**Mar 31/07**
150	19-20	Consignation + Dépose Réseaux	5 j	Lun 05/03	Ven 09/03
151	4	Désamiatage	12 j	Lun 12/03	Mar 27/03
152	4	Démolition	13 j	Mer 28/03	Ven 13/04
153	12	Métallerie - Charpente Metallique	15 j	Lun 02/04	Ven 20/04
154	**8**	**Menuiseries Aluminium**	**5 j**	**Mer 28/03**	**Mar 03/04**
155	8	Dépose Menuiseries	2 j	Mer 28/03	Jeu 29/03
156	8	Repose Menuiseries	3 j	Ven 30/03	Mar 03/04
157	7 - 8	Occultations (Strores Ext.)	2 j	Mer 04/04	Jeu 05/04
158	**19**	**CVC Plomb. Sanit.**	**38 j**	**Lun 16/04**	**Mar 12/06**
159	**19**	**CVC Plomb. Sanit. Rdc**	**5 j**	**Lun 16/04**	**Ven 20/04**
160	19	Réseau condensats depuis R+1	2 j	Lun 16/04	Mar 17/04
161	19	Réseau de plomberie (EF/Evac)	5 j	Lun 16/04	Ven 20/04
162	**19**	**CVC Plomb. Sanit. R+1**	**38 j**	**Lun 16/04**	**Mar 12/06**
163	19	Dévoiement réseau chauffage	3 j	Lun 16/04	Mer 18/04
164	19	Réalisation des panoplies chaud	10 j	Jeu 19/04	Jeu 03/05
165	19	Calorifuge des panoplies	10 j	Ven 04/05	Lun 21/05
166	19	Pose et raccordement radiateurs	3 j	Ven 08/06	Mar 12/06
167	19	Pose des 2 groupes froids	1 j	Lun 16/04	Lun 16/04
168	19	Réalisation des panoplies eau glacée	20 j	Mar 17/04	Mer 16/05
169	19	Calorifuge des panoplies	15 j	Ven 18/05	Ven 08/06
170	19	Tuyauteries chaud, froid et condensats K7	20 j	Lun 16/04	Mar 15/05
171	19	Calorifuge	10 j	Mer 16/05	Jeu 31/05
172	19	Pose et raccordement 20 K7	10 j	Mer 16/05	Jeu 31/05
173	19	Raccordement électrique sur K7	3 j	Ven 01/06	Mar 05/06
174	19	Réseau aérauliques VMC sanitaires	3 j	Lun 16/04	Mer 18/04
175	19	Réseaux aérauliques CTA	10 j	Lun 16/04	Ven 27/04
176	19	Calorifuge aéraulique	10 j	Lun 30/04	Mar 15/05
177	19	Alim EF/EC/Evac sanitaire	10 j	Lun 16/04	Ven 27/04
178	19	Appareillage sanitaires	3 j	Lun 30/04	Jeu 03/05
179	19	Armoire de climatisation serveur	3 j	Lun 16/04	Mer 18/04
180	**19-20**	**Electricité**	**63 j**	**Lun 16/04**	**Mar 17/07**
181	20	Chemin de câbles Niv 01	10 j	Lun 16/04	Ven 27/04
182	20	Chemin de câbles Niv 00	10 j	Lun 30/04	Mar 15/05
183	20	Câblage Niv 01	10 j	Lun 30/04	Mar 15/05
184	20	Câblage Niv 00	10 j	Mer 16/05	Jeu 31/05
185	20	Appareillages Niv 01	5 j	Ven 06/07	Jeu 12/07
186	20	Appareillages Niv 00	3 j	Ven 13/07	Mar 17/07
187	-	**Cloisons - Doublages - Faux-plafonds**	**58 j**	**Lun 23/04**	**Mar 17/07**
188	10	Cloisons Doublages Plafonds plâtre	30 j	Lun 23/04	Jeu 07/06
189	10	Ossatures Fx-plafonds	10 j	Ven 01/06	Jeu 14/06
190	10	Blanchissage	5 j	Mer 11/07	Mar 17/07
191	-	**Menuiseries Intérieures**	**58 j**	**Mer 28/03**	**Jeu 21/06**
192	9	Skydômes - Fenêtres de toit - Désenfumages	10 j	Mer 28/03	Mar 10/04
193	9	Huisseries	0 j	Lun 23/04	Lun 23/04
194	9	Menuiseries Int.	30 j	Mer 09/05	Jeu 21/06
195	14	Carrelage - Faïence	10 j	Ven 01/06	Jeu 14/06
196	13	Sols collés PVC	10 j	Ven 22/06	Jeu 05/07
197	-	**Peintures Intérieures**	**25 j**	**Ven 01/06**	**Jeu 05/07**
198	15	Peintures Intérieures Niv 01	15 j	Ven 01/06	Jeu 21/06
199	15	Peintures Intérieures Niv 00	10 j	Ven 22/06	Jeu 05/07
200	-	**Raccordement avec bâtiment existant G/H**	**28 j**	**Ven 01/06**	**Mar 10/07**
201	4	Dépose	3 j	Ven 01/06	Mar 05/06
202	9	Menuiseries intérieures	3 j	Lun 18/06	Mer 20/06
203	10	Cloisons - Doublages	5 j	Lun 18/06	Ven 22/06
204	19	Câblages	3 j	Mar 19/06	Jeu 21/06
205	20	Distribution	3 j	Lun 25/06	Mer 27/06
206	15	TV + 1ère couche peinture	4 j	Lun 25/06	Jeu 28/06
207	10	Faux-plafonds (ossatures)	2 j	Ven 29/06	Lun 02/07
208	13	Sols collés PVC	3 j	Mar 03/07	Jeu 05/07
209	15	Peinture	2 j	Ven 06/07	Lun 09/07
210	15	Finitions peinture	1 j	Mar 10/07	Mar 10/07
211	19-20	Appareillages	1 j	Mar 10/07	Mar 10/07
212	10	Faux plafonds (blanchissage)	1 j	Mar 10/07	Mar 10/07
213	-	**Essais - OPR**	10 j	Mer 18/07	Mar 31/07
214	-	**Mise à dispo de la zone**	0 j	Mar 31/07	Mar 31/07

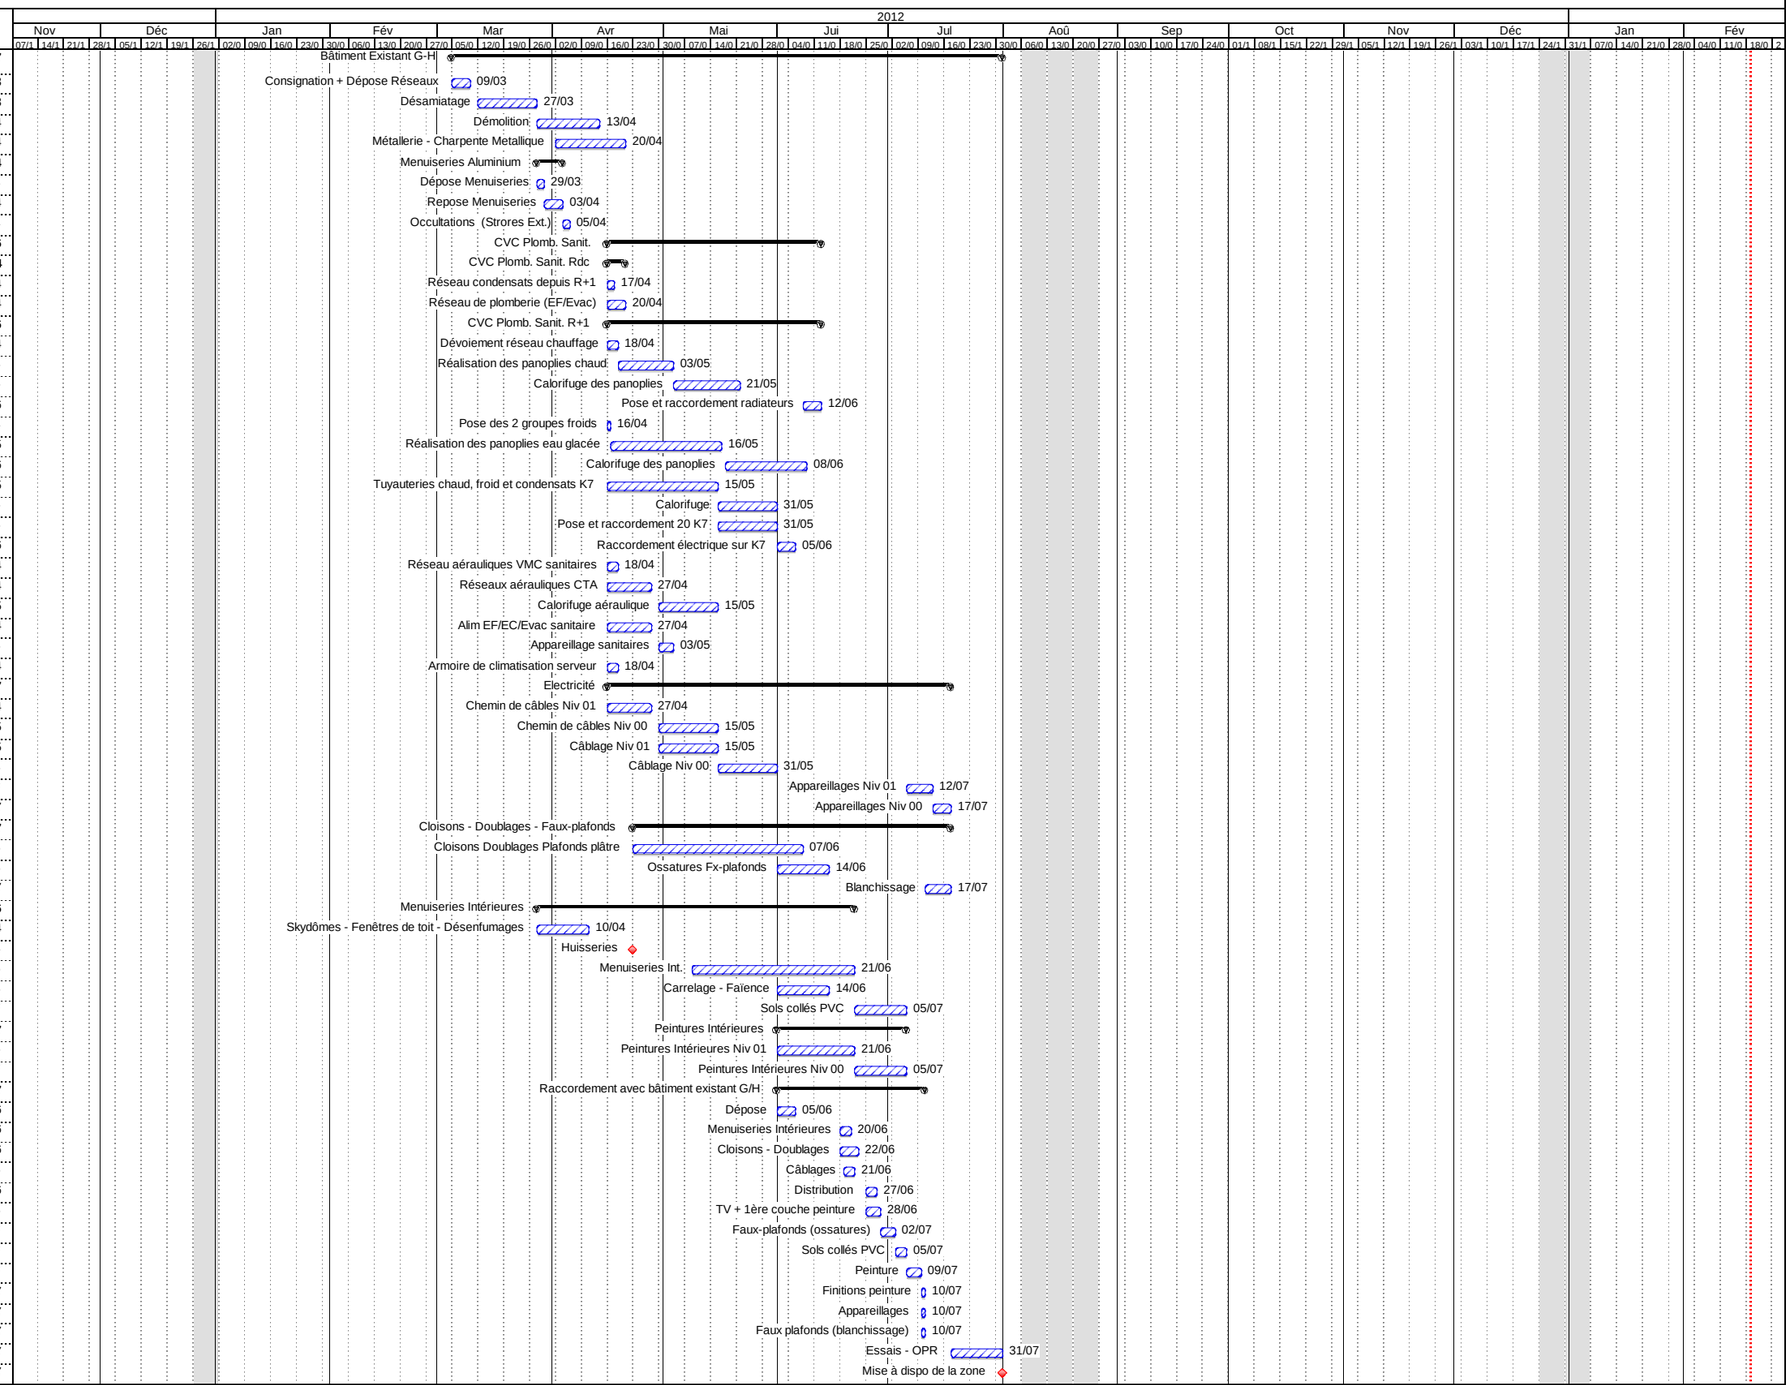

Tâche — Récapitulative — Jalon — Marge totale — Marge libre

Grenoble INP
OPERATION GEMME & CORIOLIS
Laboratoire LEGI
PLANNING DCE

N°	Lot	Nom	Durée	Début	Fin
215	-	**Bâtiement CORIOLIS**	**258 j**	**Mer 09/11**	**Ven 07/12**
216	-	**Travaux préparatoires**	**23 j**	**Mer 09/11**	**Ven 09/12**
217	1	Abbatage des arbres	5 j	Mer 09/11	Mar 15/11
218	2	Dévoiement réseaux EU	5 j	Lun 21/11	Ven 25/11
219	MOA	Dévoiement GAZ	0 j	Lun 09/12	Ven 09/12
220	1	Clôture + protection arbres ???	3 j	Jeu 12/01	Lun 16/01
221	19-20	Consignation des réseaux	2 j	Lun 16/01	Mar 17/01
222	4	Démolition garage existant	3 j	Mer 18/01	Ven 20/01
223	2	Terrassements	10 j	Lun 23/01	Ven 03/02
224	-	**Infrastructure**	**55 j**	**Lun 13/02**	**Ven 27/04**
225	3	Pieux	15 j	Lun 13/02	Ven 02/03
226	4	Installation Grue + centrale béton	5 j	Lun 05/03	Ven 09/03
227	4	Recepage tête de pieux + Massifs + Longrines	35 j	Lun 12/03	Ven 27/04
228	-	**Structure**	**98 j**	**Lun 09/04**	**Mar 18/09**
229	4	Élev coulé en place	51 j	Lun 09/04	Ven 22/06
230	4	Poteaux préfabriqués	8 j	Lun 07/05	Ven 18/05
231	4	Prémur et panneaux préfabriqués	28 j	Lun 14/05	Ven 22/06
232	4	Dallage préfabriqué et coulage	23 j	Lun 14/05	Ven 15/06
233	4	Plancher ht Rdc	5 j	Lun 25/06	Ven 29/06
234	4	Plancher Ht R+1	10 j	Lun 02/07	Ven 13/07
235	-	***Mise en place des cuves***	***5 j***	***Lun 16/07***	***Ven 20/07***
236	4	Charpente béton	10 j	Lun 23/07	Ven 03/08
237	4	Maçonnerie	10 j	Lun 27/08	Ven 07/09
238	4	Cuvelage	2 j	Lun 17/09	Mar 18/09
239	**4**	**Zone Bureaux**	**20 j**	**Lun 30/04**	**Jeu 31/05**
240	4	Plancher ht Rdc	5 j	Lun 30/04	Lun 07/05
241	4	Plancher Ht R+1	15 j	Mer 09/05	Jeu 31/05
242	-	**Enveloppe**	**95 j**	**Lun 11/06**	**Lun 12/11**
243	-	**Zone bureaux Niveau 1**	**12 j**	**Lun 11/06**	**Mar 26/06**
244	5 - 16	Façade Bardage (zone bureaux)	5 j	Lun 11/06	Ven 15/06
245	7	Menuiseries Ext Bois - Occultations	5 j	Lun 18/06	Ven 22/06
246	-	Hors d'air	0 j	Ven 22/06	Ven 22/06
247	6	Etanchéité dalle hte R+1 (zone bureaux)	5 j	Lun 18/06	Ven 22/06
248	-	Hors d'eau locaux R+1	0 j	Ven 22/06	Ven 22/06
249	11	Brise-soleil	1 j	Lun 25/06	Lun 25/06
250	7	Stores extérieurs	2 j	Lun 25/06	Mar 26/06
251	-	**Zone CUVE**	**70 j**	**Lun 16/07**	**Lun 12/11**
252	11	Blors portes métalliques	3 j	Lun 16/07	Mer 18/07
253	11	Porte sectionnelle	1 j	Jeu 19/07	Jeu 19/07
254	18	Monorail	2 j	Jeu 02/08	Ven 03/08
255	6	Couverture	5 j	Lun 27/08	Ven 31/08
256	6	Dépose des filets	2 j	Lun 03/09	Mar 04/09
257	5 - 16	Façade Bardage	50 j	Lun 03/09	Lun 12/11
258	6	Etanchéité	20 j	Lun 03/09	Ven 28/09
259	6	Hors d'eau Général	0 j	Ven 14/09	Ven 14/09
260	6	Finitions étanchéité	15 j	Lun 01/10	Ven 19/10
261	-	**Aménagement Intérieur**	**166 j**	**Lun 05/03**	**Lun 19/11**
262	-	**Zone bureau Niveau 1**	**60 j**	**Lun 11/06**	**Ven 21/09**
263	**19-20**	**Lots Techniques**	**60 j**	**Lun 11/06**	**Ven 21/09**
264	19	Tuyauteries chaud, froid et condensats	10 j	Lun 11/06	Ven 22/06
265	19	Calorifuge	5 j	Lun 25/06	Ven 29/06
266	19	Pose et raccordement 6 K7	3 j	Lun 27/08	Mer 29/08
267	19	Raccordement électrique sur K7	1 j	Jeu 30/08	Jeu 30/08
268	19	Réseaux aérauliques CTA	7 j	Lun 11/06	Mar 19/06
269	19	Calorifuge aéraulique	5 j	Mer 20/06	Mar 26/06
270	19	Alim EF/EC/Evac sanitaire	7 j	Lun 11/06	Mar 19/06
271	19	Appareillage sanitaires	1 j	Ven 21/09	Ven 21/09
272	20	Chemin de câbles	10 j	Lun 11/06	Ven 22/06
273	20	Câblages	15 j	Lun 25/06	Ven 13/07
274	20	Pose et raccodement des armoires éle	15 j	Lun 09/07	Ven 27/07
275	9	Huisseries Intérieures	0 j	Lun 25/06	Lun 25/06
276	10	Cloisons - Doublages - Plafonds plâtre	10 j	Lun 25/06	Ven 06/07
277	9	Menuiseries à peindre	10 j	Lun 02/07	Ven 13/07
278	15	TV + 1ère couche peinture	5 j	Lun 16/07	Ven 20/07
279	10	Faux-plafonds démontables (ossatures)	10 j	Lun 23/07	Ven 03/08
280	13	Sols collés PVC	10 j	Lun 27/08	Ven 07/09
281	9	Placards	5 j	Lun 03/09	Ven 07/09
282	15	Peinture	5 j	Lun 10/09	Ven 14/09
283	15	Finitions peinture	5 j	Lun 17/09	Ven 21/09
284	19-20	Appareillages	5 j	Lun 17/09	Ven 21/09
285	10	Faux plafonds (blanchissage)	2 j	Jeu 20/09	Ven 21/09
286	-	**Zone CUVE**	**166 j**	**Lun 05/03**	**Lun 19/11**
287	12	Escalier métallique	5 j	Lun 03/09	Ven 07/09
288	11	Gardes coprs	8 j	Lun 10/09	Mer 19/09

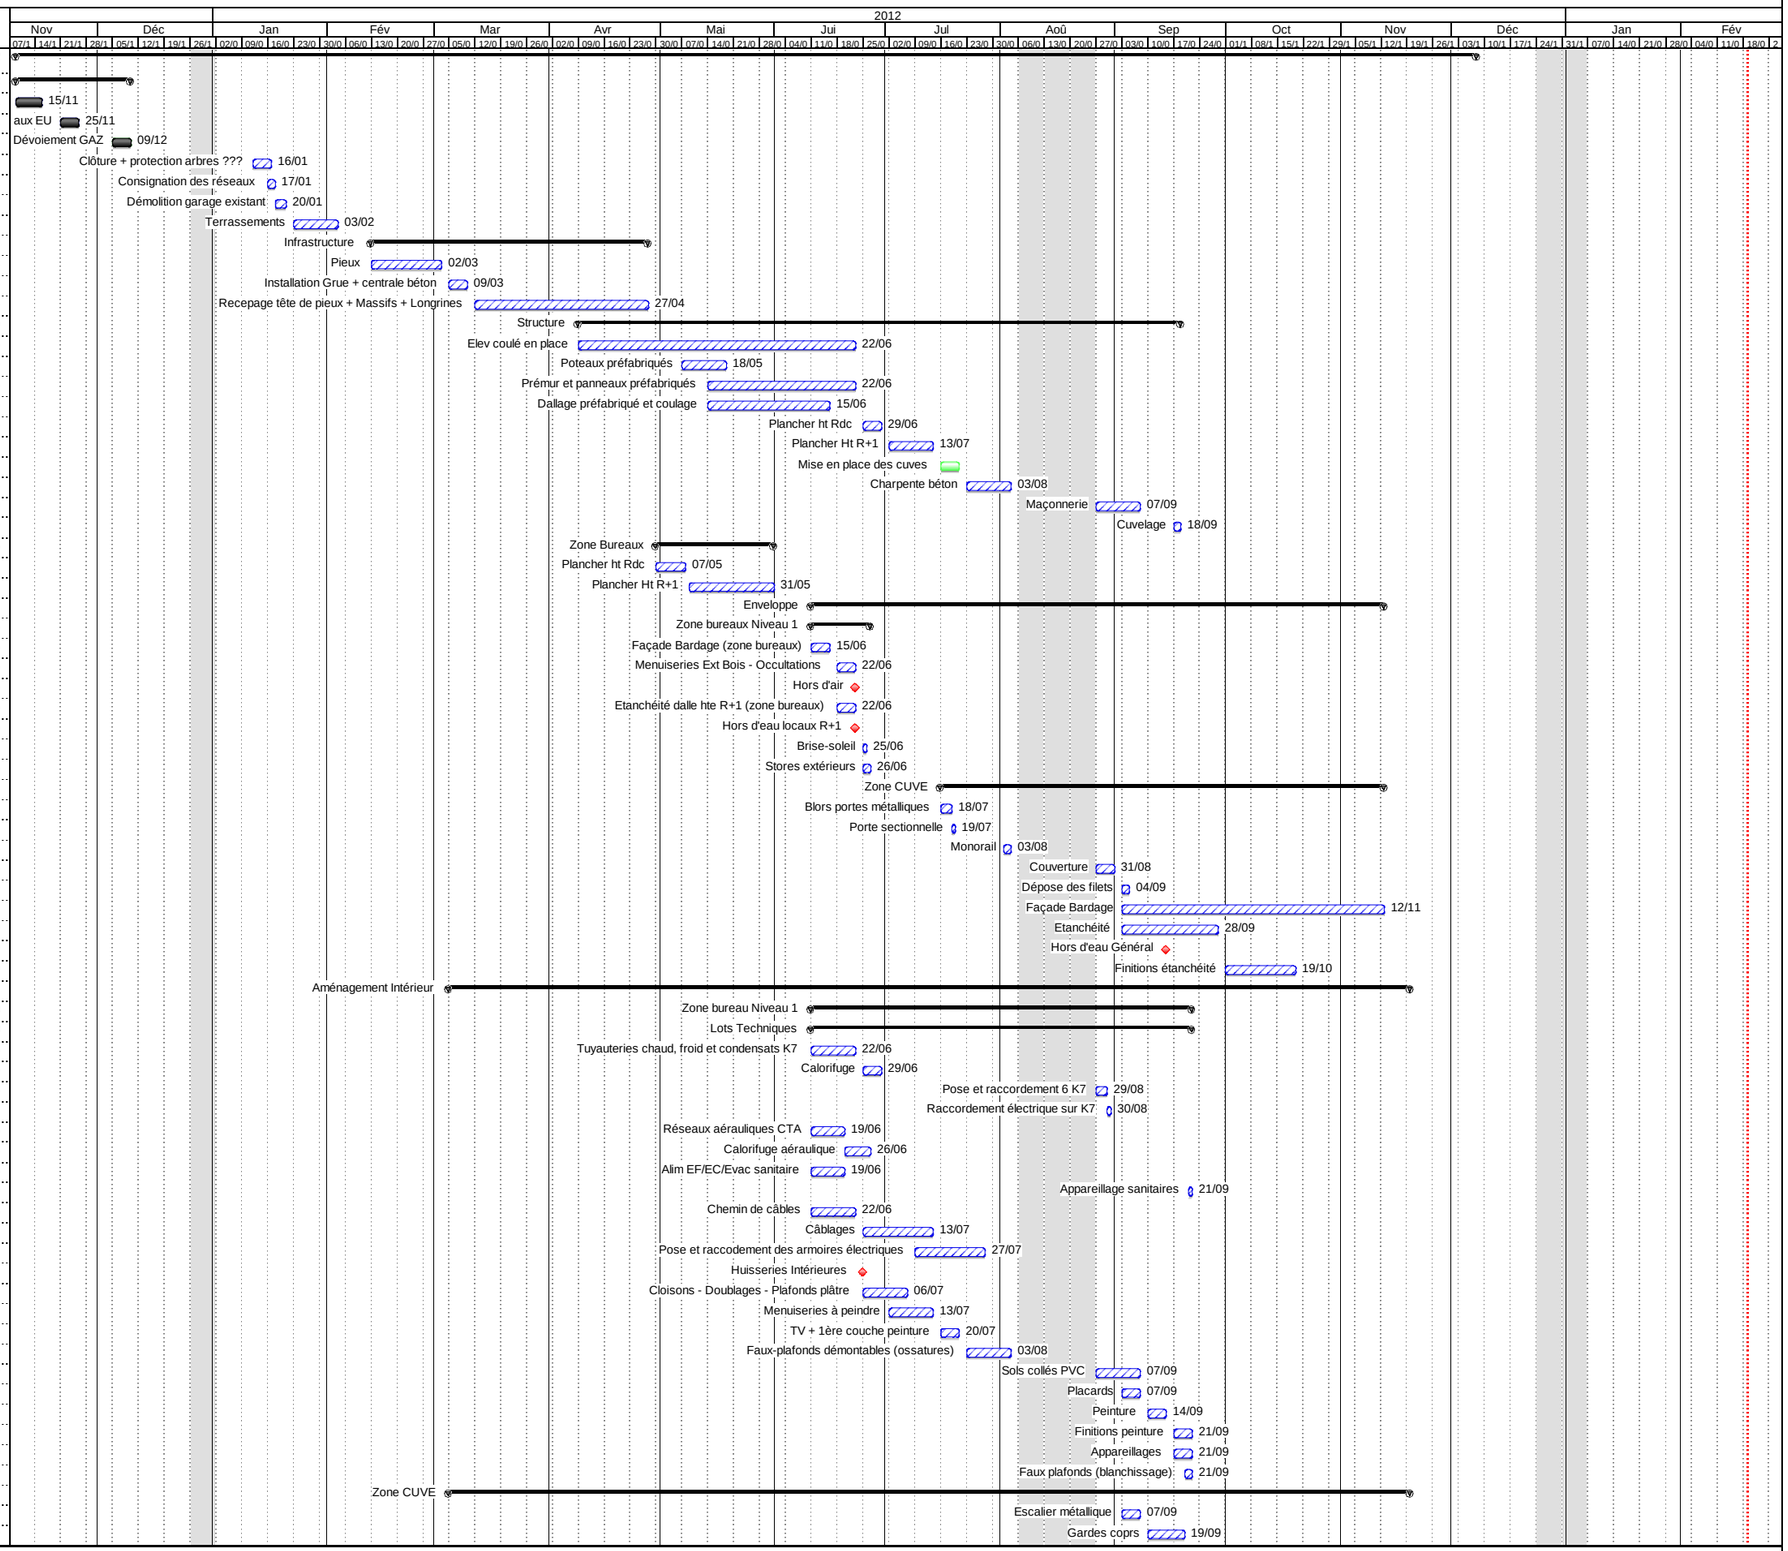

Tâche — Récapitulative — Jalon — Marge totale — Marge libre

Grenoble INP
OPERATION GEMME & CORIOLIS
Laboratoire LEGI
PLANNING DCE

N°	Lot	Nom	Durée	Début	Fin
289	**17**	**Ascenseur**	**15 j**	**Mer 19/09**	**Mar 09/10**
290	17	Guides / Partie mécanique / Portes	10 j	Mer 19/09	Mar 02/10
291	17	Partie Electrique / Finitions	5 j	Mer 03/10	Mar 09/10
292	**20**	**Electricité**	**161 j**	**Lun 05/03**	**Lun 12/11**
293	20	Mise à la terre + incorporations	60 j	Lun 05/03	Jeu 31/05
294	20	Chemin de câbles sous toiture	10 j	Lun 10/09	Ven 21/09
295	20	Câblages	15 j	Lun 24/09	Ven 12/10
296	20	Appareillages	20 j	Lun 15/10	Lun 12/11
297	**19**	**CVC Plomb. Sanit. R+1**	**39 j**	**Mer 05/09**	**Lun 29/10**
298	19	VMC tourelle	2 j	Lun 17/09	Mar 18/09
299	19	Réseaux aérauliques CTA bureaux	3 j	Mer 05/09	Ven 07/09
300	19	Calorifuge aéraulique	2 j	Lun 10/09	Mar 11/09
301	19	Pose CTA bureaux	3 j	Lun 17/09	Mer 19/09
302	19	Raccordement hydraulique CTA	2 j	Jeu 20/09	Ven 21/09
303	19	Calorifuge	2 j	Lun 24/09	Mar 25/09
304	19	Pose CTA coriolis	1 j	Lun 17/09	Lun 17/09
305	19	Raccordement frigorifique CTA	5 j	Mar 18/09	Lun 24/09
306	19	Raccordement hydraulique CTA	5 j	Mar 18/09	Lun 24/09
307	19	Calorifuge	3 j	Mar 25/09	Jeu 27/09
308	19	Réseaux aérauliques CTA Coriolis	15 j	Mar 18/09	Lun 08/10
309	19	Calorifuge aéraulique	8 j	Mar 09/10	Jeu 18/10
310	19	Distribution électrique CTA	5 j	Mar 18/09	Lun 24/09
311	19	Alim EF/EC/Evac sanitaire	2 j	Lun 17/09	Mar 18/09
312	19	Appareillage sanitaire	2 j	Mer 19/09	Jeu 20/09
313	19	Mise en service global HVAC	15 j	Mar 09/10	Lun 29/10
314	15	Peinture	20 j	Lun 22/10	Lun 19/11
315	-	**Aménagement Extérieur**	**109 j**	**Lun 18/06**	**Ven 07/12**
316	2	VRD	20 j	Lun 18/06	Ven 13/07
317	2	Espaces Verts	20 j	Lun 12/11	Ven 07/12
318	11	Clôture + porte local vélo	2 j	Jeu 29/11	Ven 30/11
319	-	**Provision intempéries**	15 j	Lun 10/12	Ven 11/01
320	-	**Essais**	5 j	Lun 14/01	Ven 18/01
321	-	**OPR**	20 j	Lun 21/01	Ven 15/02
322	-	**Réception**	0 j	Lun 18/02	Lun 18/02

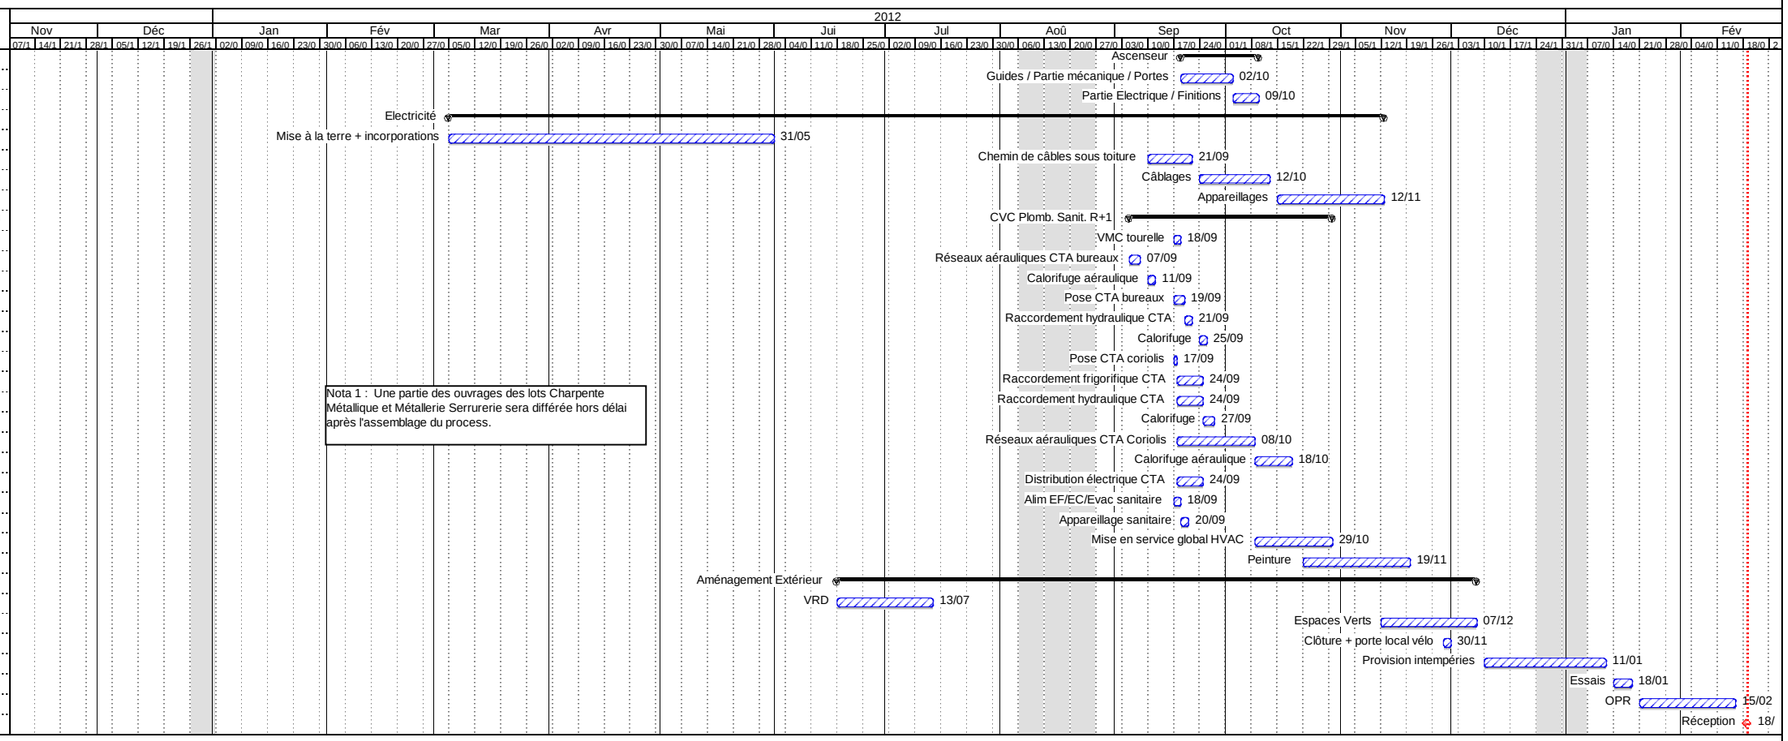

Nota 1 : Une partie des ouvrages des lots Charpente Métallique et Métallerie Serrurerie sera différée hors délai après l'assemblage du process.

Tâche — Récapitulative — Jalon — Marge totale — Marge libre
