




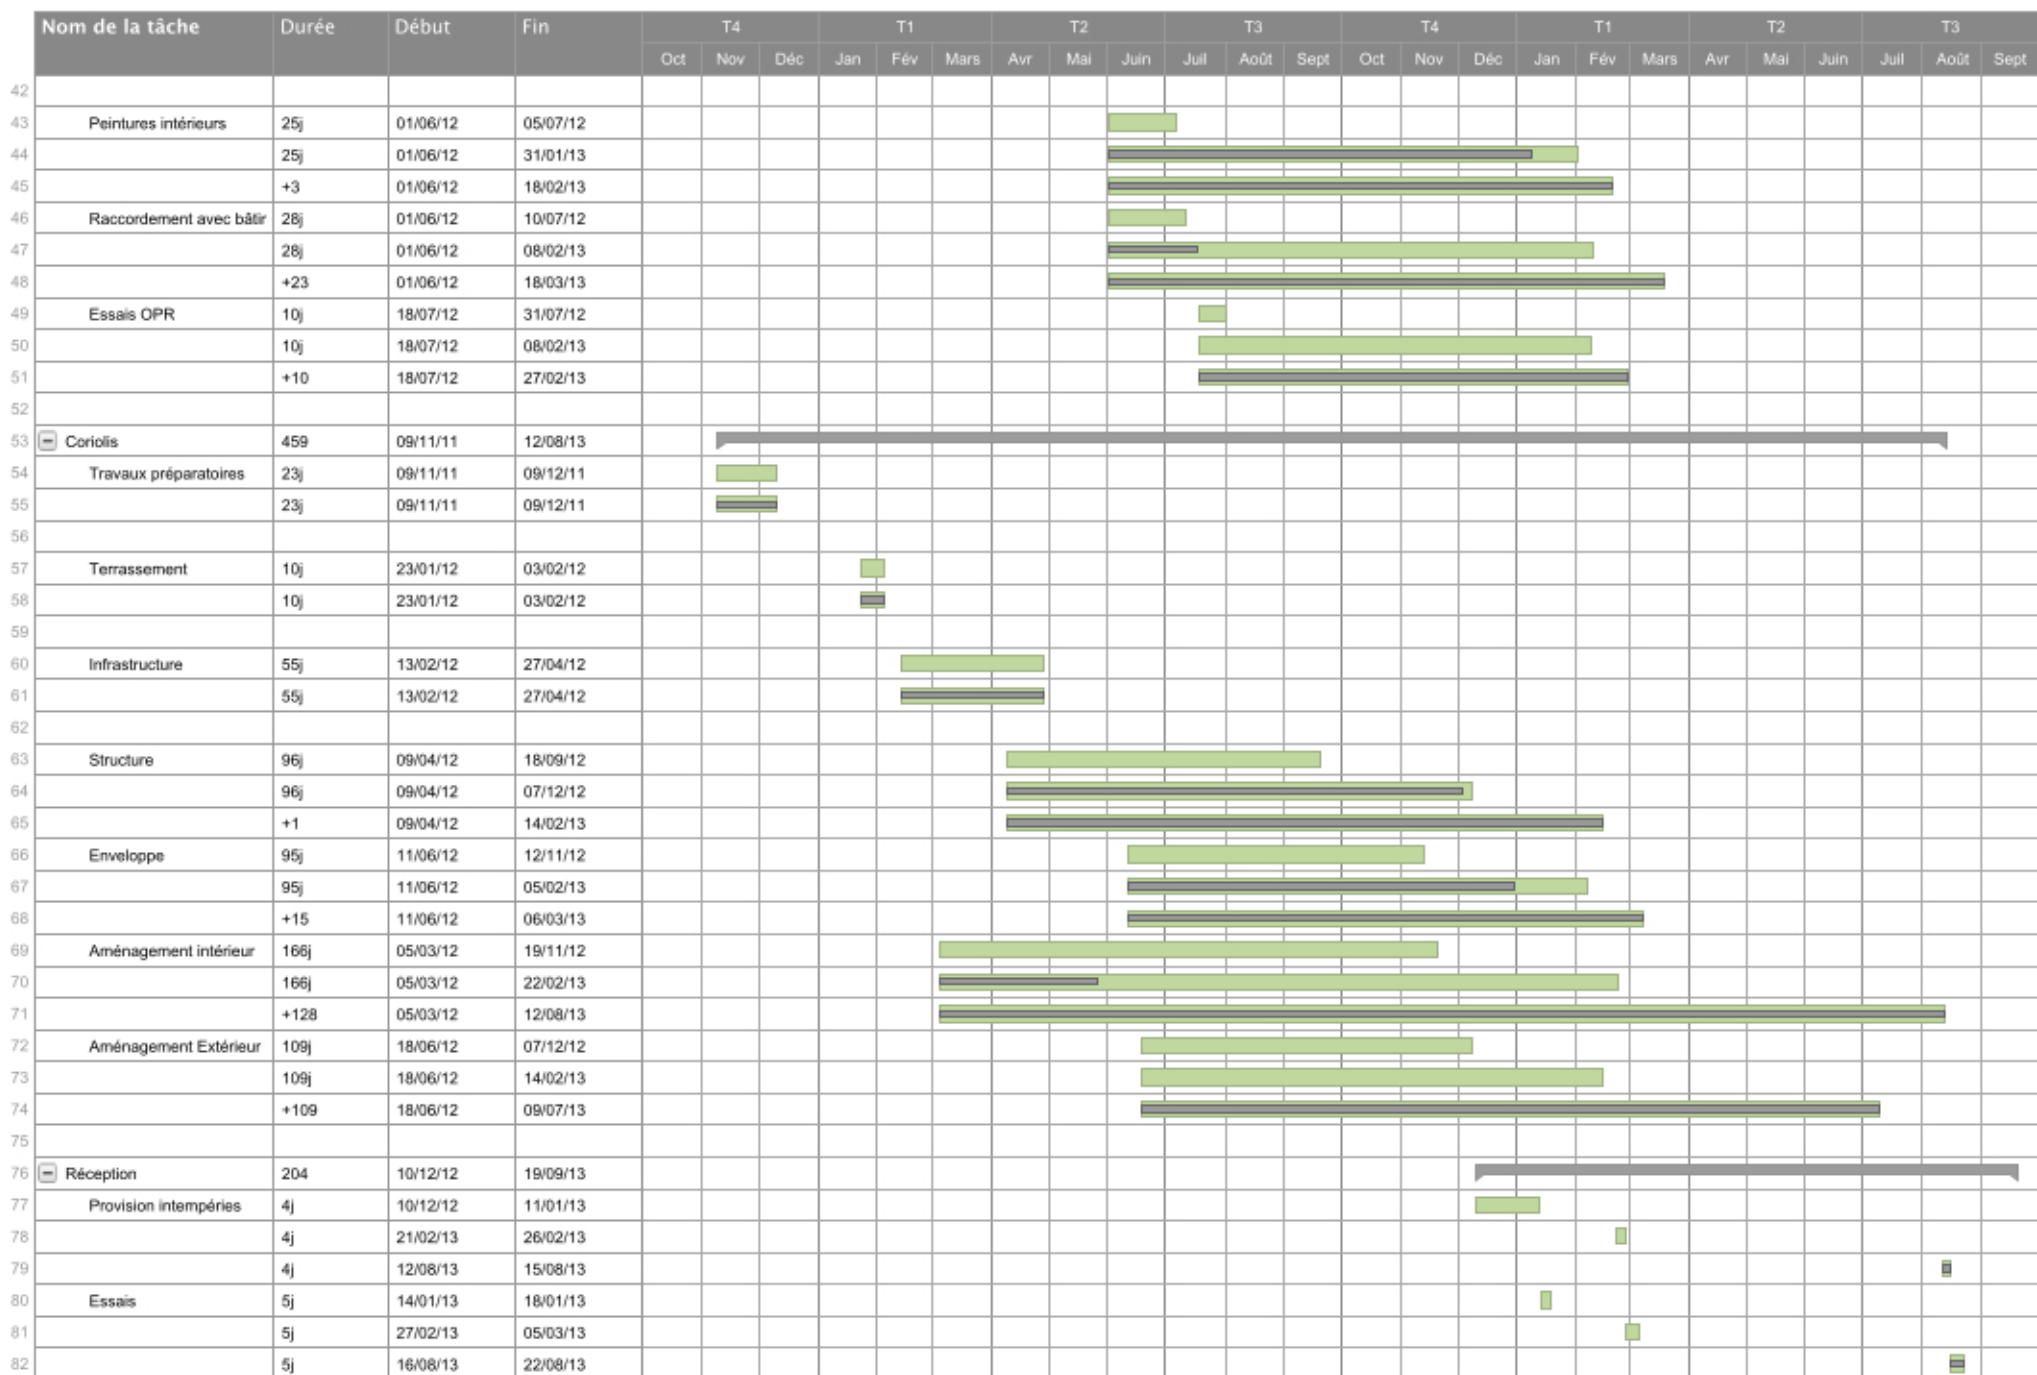

	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	T4			T1			T2			T3			T4			T1			T2			T3		
					Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mars	Avr	Mai	Juin	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mars	Avr	Mai	Juin	Juil	Août	Sept
83	OPR	20j	21/01/13	15/02/13																								
84		20j	06/03/13	02/04/13																								
85		20j	23/08/13	19/09/13																								
86	Réception	0j	18/02/13	18/02/13																								
87		0j	02/04/13	02/04/13																								
88		0j	19/09/13	19/09/13																								

Légende :

Les titres de premier niveau (GEMME, GH, Coriolis et Réception) ont une ligne gris à droite qui montre la durée totale des travaux en hypothèse.

Les titres de deuxième niveau (Terrassement, Infrastructure...) ont une ligne verte à droite qui montre le le planning provisionnel du 27/01/2012.

La deuxième ligne des titres de deuxième niveau est le planning pointé du 13/02/2013 où la ligne verte représente la dernière modification du planning provisionnel et en gris les travaux accomplis jusqu'au 13/02/2013.

La troisième ligne des titres de deuxième niveau représente une hypothèse de la date de finalisation des travaux. Cette hypothèse est calculée en ajoutant les jours qui manquent de travaux après le 13/02/2013.
